

揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表 【平成30年度】

平成30年度合同点検結果

【小島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	町道11号線	上野地内	スピードを出して通行する車が多く、児童が横断歩道を渡る際に危険である。	信号機の設置は困難。 （設置基準等を満足しない）	揖斐警察署
				安全対策（減速標示など）を検討する。	揖斐川町 （建設課）
2	町道11号線	白樫地内	スピードを出して通行する車が多く、児童が横断歩道を渡る際に危険である。	信号機の設置は困難。 （設置基準等を満足しない）	揖斐警察署
				安全対策（減速標示など）を検討する。	揖斐川町 （建設課）
3	町道11号線	市場地内	スピードを出して通行する車が多く、児童が横断歩道を渡る際に危険である。	信号機の設置は困難。 （設置基準等を満足しない）	揖斐警察署
				安全対策（注意喚起標示など）を検討する。	揖斐川町 （建設課）
4	町道11号線	市場地内	大型交通量が多く、歩道が整備されていないため通学路として危険である。	歩行スペースの確保を検討する。 （水路に蓋を設置）	揖斐川町 （建設課）
5	町道665号線	市場地内	通学路沿いの水路に高低差（1～2m）があるため、転落事故が懸念され危険である。	安全対策（転落防止）を検討する。 （ただし地域の合意形成に課題あり）	揖斐川町 （建設課）
6	一般県道藤橋池田線	新宮地内	歩道が未整備となっている約20mの区間が通学路として危険である。	歩道整備は短期的には困難。 （地域の合意形成に課題あり）	揖斐土木事務所
				通学路の見直しを検討する。	小島小学校

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立小島小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

揖斐川町 通学路 要対策箇所図【平成30年度】

学校区	小島小学校
点検年	平成30年10月

通学路安全推進会議メンバー
揖斐川町教育委員会学校教育課
揖斐川町総務部総務課
揖斐川町産業建設部建設課
揖斐警察署
揖斐土木事務所
揖斐川町立小学校・PTA

【通学路の状況】
・スピードを出して通行する車が多く、児童が横断歩道を渡る際に危険



【対策(予定)内容】
・安全対策(減速標示など)を検討

【通学路の状況】
・スピードを出して通行する車が多く、児童が横断歩道を渡る際に危険



【対策(予定)内容】
・安全対策(減速標示など)を検討

【通学路の状況】
・スピードを出して通行する車が多く、児童が横断歩道を渡る際に危険



【対策(予定)内容】
・安全対策(注意喚起標示など)を検討

【通学路の状況】
・通学路沿いの水路に高低差(1~2m)があるため、転落事故が懸念され危険



【対策(予定)内容】
・安全対策(転落防止)を検討

【通学路の状況】
・歩道が未整備となっている約20mの区間が通学路として危険



【対策(予定)内容】
・通学路の見直しを検討

【通学路の状況】
・大型交通量が多く、歩道が整備されていないため通学路として危険



【対策(予定)内容】
・安全対策を検討

凡例	
	通学路(学校指定)
	要対策箇所

1:7500 100 m

揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表 【平成30年度】

平成30年度合同点検結果

【清水小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	町道13号線～ 町道16号線	清水地内	車両交通量が通学時間帯に多く、道路幅員が4～5mと狭いため、接触事故などが懸念され危険である。	標識移設など改善を検討する。	揖斐警察署
2	町道13号線 町道203号線	清水地内	路面排水の不良により雨水が溜まり、通学に支障となっている。また、カラー舗装の劣化、マンホール蓋の沈下が進行している。	維持修繕を検討する。	揖斐川町 (建設課)
3	町道16号線	清水地内	通学している路肩(土砂)が、歩き難く危険である。	路肩舗装を検討する。	揖斐川町 (建設課)

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立清水小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

揖斐川町 通学路 要対策箇所図【平成30年度】

学校区	清水小学校
点検年	平成30年10月




【通学路の状況】
 ・路面排水の不良により雨水が溜まり、通学に支障
 ・カラー舗装の劣化、マンホール蓋の沈下が進行



【対策(予定)内容】
 ・維持修繕を検討

【通学路の状況】
 ・車両交通量が通学時間帯に多く、道路幅員が4～5mと狭いため、接触事故などが懸念され危険



【対策(予定)内容】
 ・標識移設など改善を検討

【通学路の状況】
 ・通学している路肩(土砂)が、歩き難く危険



【対策(予定)内容】
 ・路肩舗装を検討

通学路安全推進会議メンバー

揖斐川町教育委員会学校教育課
揖斐川町総務部総務課
揖斐川町産業建設部建設課
揖斐警察署
揖斐土木事務所
揖斐川町立小学校・PTA

凡例

	通学路(学校指定)
	要対策箇所

1:5000

揖斐川町 通学路 要対策箇所一覧表 【平成30年度】

平成30年度合同点検結果


【谷汲小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体
1	主要地方道山東本巢線	谷汲下長瀬地内	道路側溝の流末が開水路となっており、通学時に転落事故が懸念され危険である。	水路改修を検討する。	揖斐土木事務所

【対策検討メンバー】 揖斐川町教育委員会学校教育課、揖斐川町立谷汲小学校・PTA、揖斐警察署、揖斐土木事務所、揖斐川町総務課・建設課

揖斐川町 通学路 要対策箇所図【平成30年度】

学校区	谷汲小学校
点検年	平成30年10月

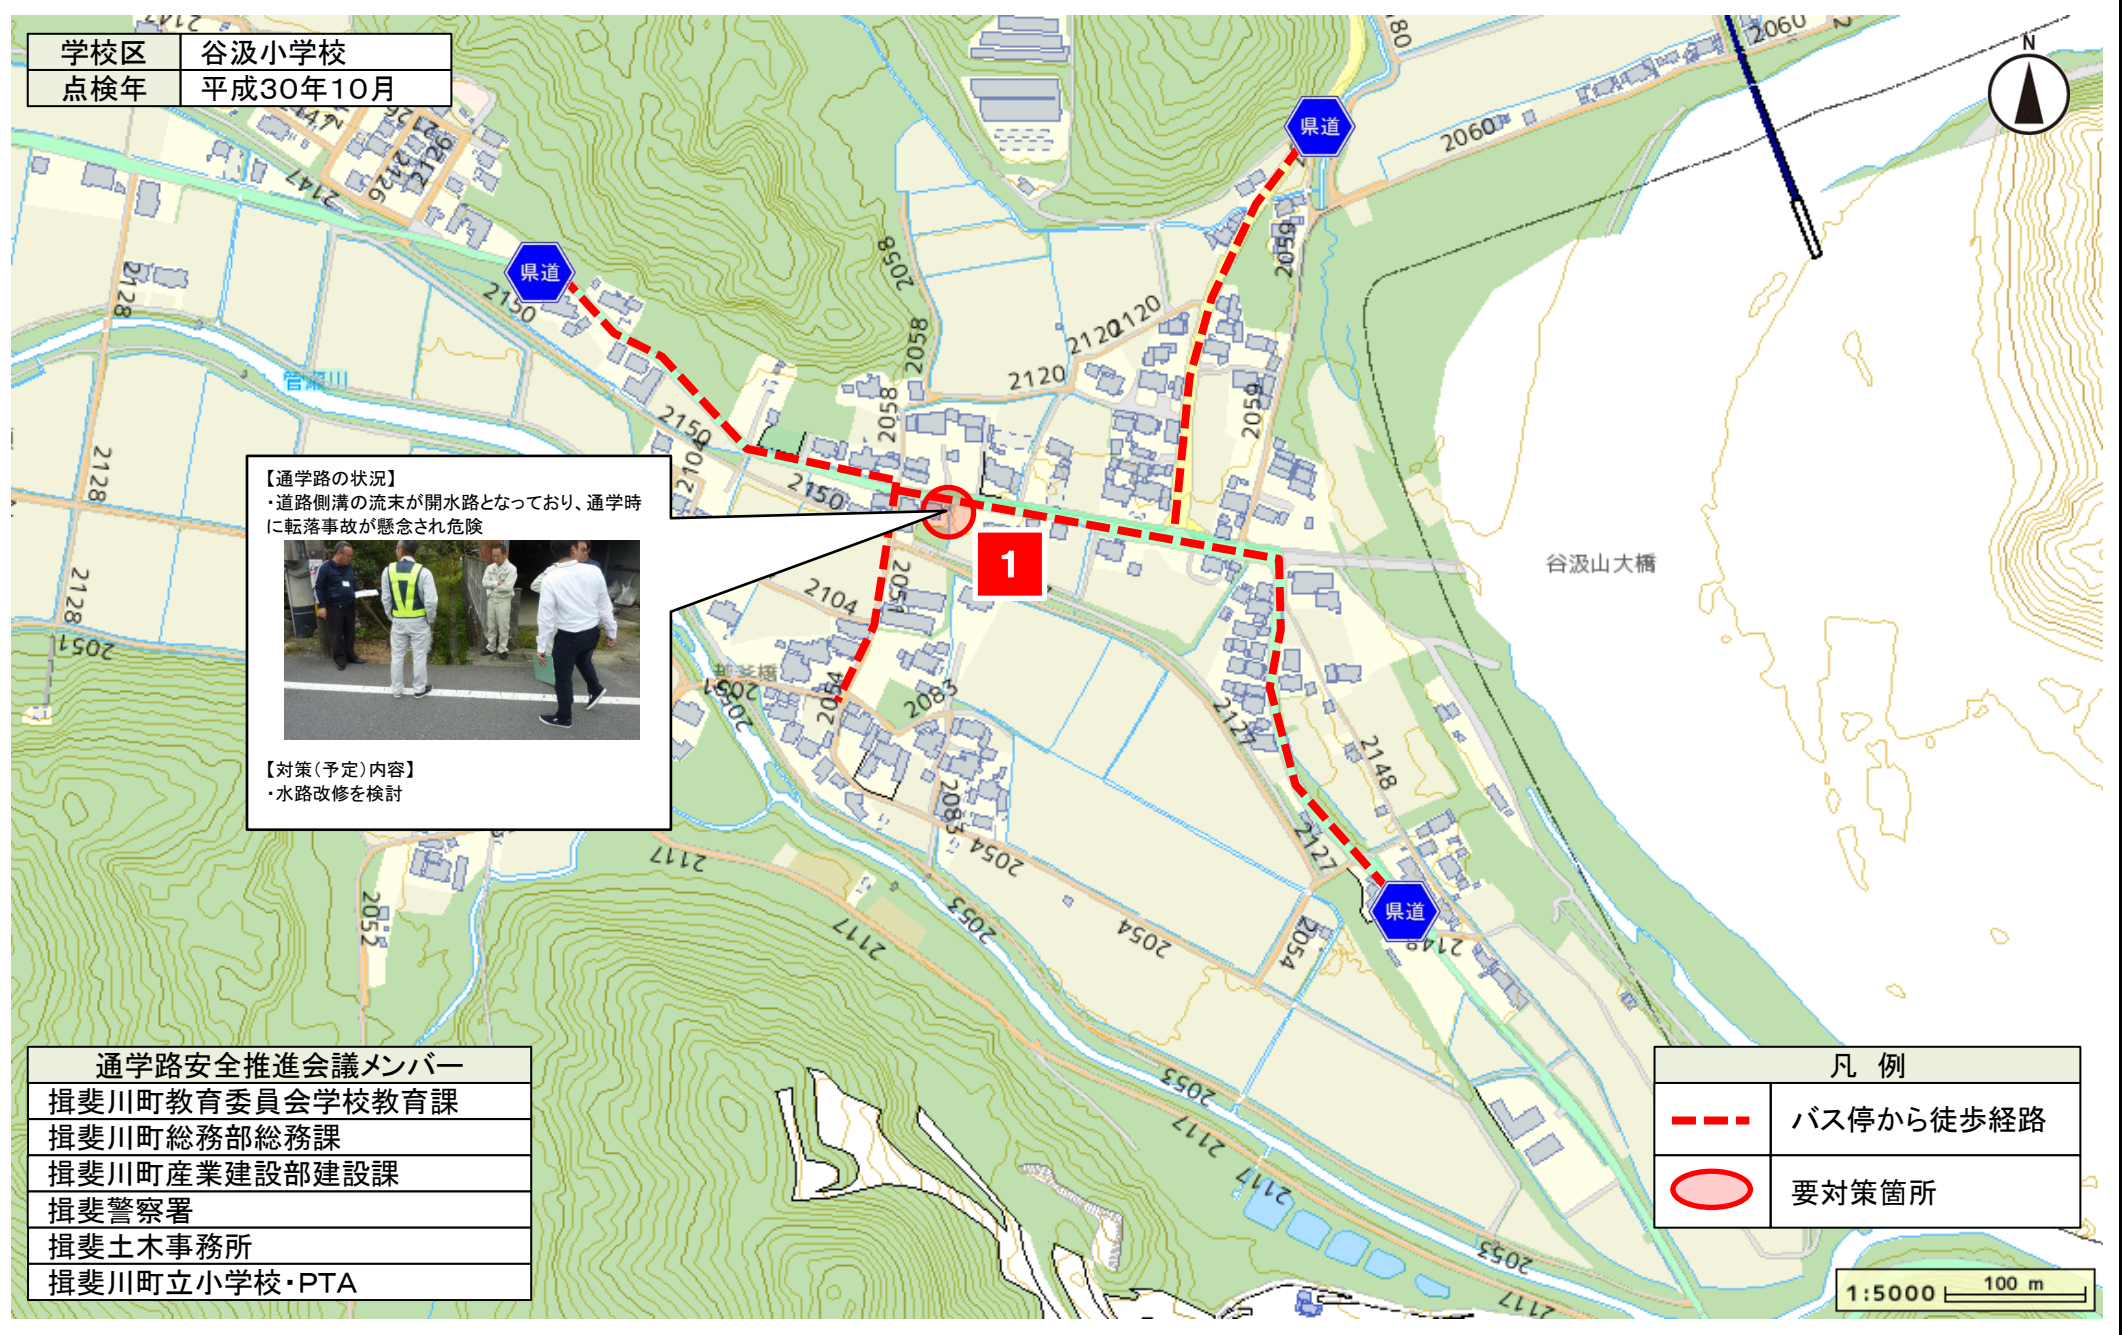

【通学路の状況】
 ・道路側溝の流末が開水路となっており、通学時に転落事故が懸念され危険



【対策(予定)内容】
 ・水路改修を検討

通学路安全推進会議メンバー	
揖斐川町教育委員会学校教育課	
揖斐川町総務部総務課	
揖斐川町産業建設部建設課	
揖斐警察署	
揖斐土木事務所	
揖斐川町立小学校・PTA	

凡例	
	バス停から徒歩経路
	要対策箇所

1:5000 100 m

揖斐川町 通学路 既対策箇所一覧表 【平成30年度】

※プログラム（7）3により、既に事業化等されている箇所および計画中の箇所一覧

平成30年10月現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（予定）内容	事業主体	学校区	備考
(一) 藤橋池田線	小島地内		歩道設置	揖斐土木事務所	小島小学校	
(国) 417号	下岡島・和田地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
(都) 大野揖斐川線	三輪地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
(国) 417号 (一) 揖斐川谷汲山線	三輪地内	道路幅員が狭く歩行者の横を車両が通過し危険である。	交差点改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐小学校	
(一) 本庄揖斐川線	清水地内		道路新設改良／歩道設置	揖斐土木事務所	清水小学校	
町道18号線 揖斐川白石上松原線	上ミ野地内	道路幅員が狭く歩行者の横を車両が通過し危険である。	道路拡幅、歩道設置	揖斐川町 (建設課)	揖斐小学校	
町道952号線 揖斐川野田大門線	清水地内		道路新設改良／歩道設置	揖斐川町 (建設課)	清水小学校	
町道3号線 揖斐川平木古田流跡線	脛永地内	道路両側が開水路で路側帯の幅が確保出来されていない。	道路拡幅、歩道設置	揖斐川町 (建設課)	揖斐中学校	
(一) 本庄揖斐川線	清水地内		道路改良／歩道設置	揖斐土木事務所	揖斐中学校	
